

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Obec Předboj

se sídlem: Hlavní 18, Předboj, PSČ 250 72, pošta Kojetice u Prahy
IČO: 00240630,
Zastoupená: starostkou Pavlou Příšovskou
Bankovní spojení: KB Neratovice
číslo účtu: 12223201/0100
Kontakt (telefon, e-mail): +420725021870, starosta@predboj.cz
(dále jen „objednatel“)

a

FORTEX - AGS, a.s.

se sídlem: Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92
IČO: 00150584
DIČ: CZ00150584
Bankovní spojení: 80100409000153/0300
Zastoupená: Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva
Zápis v OR nebo jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 95
Opr. zást. ve věcech technických: Ing. Roman Ženčák
Kontakt (telefon, e-mail): +420583310111
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené strany se

vzhledem k tomu, že uzavřely dne 22. 9. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „**Rekonstrukce ČOV Předboj**“, tj. její technologická a stavební část, dodávky technologických celků, stavební a montážní práce v rozsahu vymezeném ve Smlouvě a projektové dokumentaci, která splňuje podmínky pro věcné naplnění díla co do kvality a kvantity,

vzhledem k tomu, že na straně objednatele došlo v průběhu přípravy staveniště k prodlužení, které mělo za následek posunutí původně Smlouvou zamýšleného dne předání a převzetí staveniště,

vzhledem k tomu, že výše uvedené posunutí znamenalo rovněž nutný posun, resp. změnu v harmonogramu prací ze strany zhotovitele,

a vzhledem k tomu, že dne 4. 11. 2014 byla zvolena starostkou obce Předboj paní Pavla Příšovská,

dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 1 Smlouvy

II. Předmět dodatku

2.1. V odst. 3.1 písm. a) Smlouvy se termín předání a převzetí staveniště „1. 10. 2014“ nahrazuje termínem „17. 10. 2014“.

2.2. S ohledem na posun prací ze strany zhotovitele v důsledku pozdějšího předání staveniště z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly, na žádost objednatele z důvodu nutnosti zajištění plného provozu ČOV Předboj v období vánočních a novoročních svátků, na přerušení prací ve dnech 20. 12. 2014-4. 1. 2015 včetně.

2.3. V odst. 3.1 písm. c) Smlouvy se termín dokončení díla, předání do zkušebního provozu „12. 1. 2015“ nahrazuje termínem „14. 2. 2015“.

2.4. V odst. 9.8. se slova „Ing. Karel Kodiš starosta“ nahrazují slovy „Pavla Příšovská, starostka“.

III. Závěrečná ustanovení

10.1. Pro odstranění veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nic v tomto dodatku č. 1 Smlouvy nesměřuje k prodloužení termínu zhotovení díla.

10.8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

10.9. Znění tohoto dodatku č. 1 Smlouvy zcela odpovídá dřívější ústní dohodě smluvních stran, podle které smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění dodatku č. 1 Smlouvy, a smluvní strany si tímto obsah tohoto dodatku č. 1 Smlouvy v písemné formě potvrzují.


V Předboji 12.1.2015



.....
objednatel

Obec PŘEDBOJ
Hlavní 18
250 72 Předboj

FORTEX - AGS, a.s.
ŠUMPERK, Jilová 1550/1, PSČ 78792
IČ: 00150584 DIČ: CZ699000025
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz
-44-

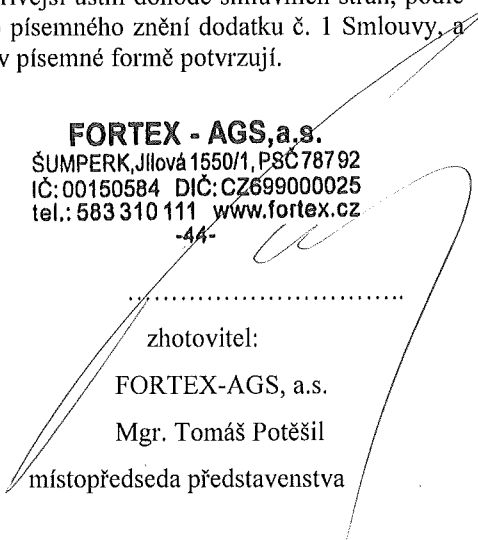

.....
zhotovitel:

FORTEX-AGS, a.s.

Mgr. Tomáš Potěšil

místopředseda představenstva
