

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Obec Předboj

se sídlem: Hlavní 18, Předboj, PSČ 250 72, pošta Kojetice u Prahy
IČO: 00240630,
Zastoupená: starostkou Pavlou Příšovskou
Bankovní spojení: KB Neratovice
číslo účtu: 12223201/0100
Kontakt (telefon, e-mail): +420725021870, starosta@predboj.cz
(dále jen „objednatel“)

a

FORTEX - AGS, a.s.

se sídlem: Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92
IČO: 00150584
DIČ: CZ00150584
Bankovní spojení: 80100409000153/0300
Zastoupená: Mgr. Tomáš Potěšil, místopředseda představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 95
Opr. zást. ve věcech technických: Ing. Roman Ženčák
Kontakt (telefon, e-mail): +420583310111
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené strany se

vzhledem k tomu, že uzavřely dne 22. 9. 2014 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Rekonstrukce ČOV Předboj“, tj. její technologická a stavební část, dodávky technologických celků, stavební a montážní práce v rozsahu vymezeném ve Smlouvě a projektové dokumentaci, která splňuje podmínky pro věcné naplnění díla co do kvality a kvantity, k níž dne 12. 1. 2015 uzavřely dodatek č. 1, jímž pro prodloužení na straně objednatele při přípravě staveniště, které mělo za následek posunutí původně Smlouvou zamýšleného dne předání a převzetí staveniště, posunuly termín zhotovení díla,

vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla nastaly skutečnosti smluvními stranami dříve nepředvídané a nepředvídatelné, spočívající v nutné změně technologického postupu z důvodu nemožnosti použití technologického postupu stanoveného projektovou dokumentací díla

a vzhledem k tomu, že výše uvedená změna znamenala rovněž nutný posun, resp. změnu v harmonogramu prací ze strany zhotovitele,

dohodly na uzavření následujícího

dodatku č. 2 Smlouvy

II. Zdůvodnění dodatku

Dne 14. 1. 2015 vznikl problém při čerpání a odvozu kalu z linky I. Fekální vůz nebyl schopen vyčerpání odpadní vody z důvodu velké sací výšky, musel být použit sací bagr. Sací bagr byl ihned poptán s možným nejbližším termínem nástupu 21. 1. 2015 a ukončením prací dne 26. 1. 2015, celkový posun zhotovení díla o 12 dnů. V důsledku posunu termínu ukončení čistících prací na lince I bylo nutno dále posunout rovněž postup dalších montážních prací, a to o 6 dnů (27. 1. 2015-1. 2. 2015).

Dne 16. 2. 2015 vznikl problém při čerpání a odvozu kalu z linky II, k jehož vyřešení musel být opět použit sací bagr, přičemž tento postup nebyl předpokládán, neboť linka II byla v běžném provozu. Další celkový posun zhotovení díla o 2 dny byl proto způsoben zdržením při nástupu montáže technologie linky II.

III. Předmět dodatku

V odst. 3.1 písm. c) Smlouvy se termín dokončení díla, předání do zkušebního provozu „14. 2. 2015“ nahrazuje termínem „6. 3. 2015“.

IV. Závěrečná ustanovení


4.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

4.2. Znění tohoto dodatku č. 2 Smlouvy zcela odpovídá dřívější ústní dohodě smluvních stran, podle které smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění dodatku č. 2 Smlouvy, a smluvní strany si tímto obsah tohoto dodatku č. 2 Smlouvy v písemné formě potvrzují.

V Předboji 14. 2. 2015



.....
objednatel
obec Předboj
Pavla Příšovská
starostka
Obec PŘEDBOJ
Hlavní 18
250 72 Předboj

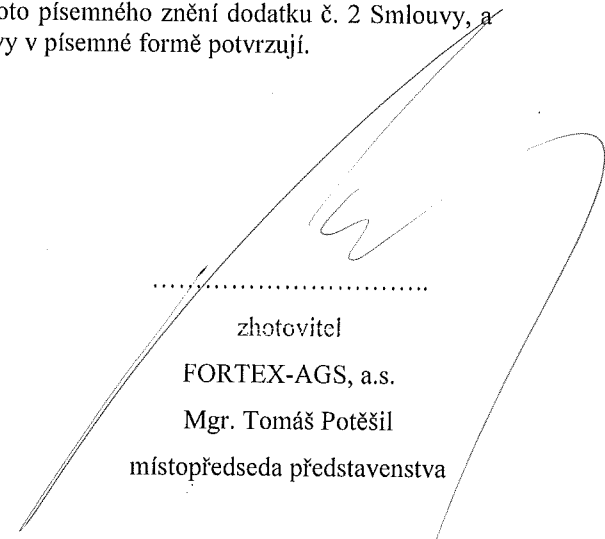

.....
zhotovitel

FORTEX-AGS, a.s.
Mgr. Tomáš Potěšil
místopředseda představenstva

FORTEX - AGS a.s.
ŠUMPERK, Jilová 1550/1 PSC 78792
IČ: 00150584 DIČ: CZ399000025
tel.: 583 310 111 www.tortex.cz
-46-
